

# Clôtures Aluminium 1/2



adresse mail :  
correzefermetures@correzefermetures.com  
Tél. : 05 55 25 13 46  
Fax : 05 55 25 19 83

## Gamme CASTEL

Adresse de Facturation :

Adresse de Livraison :

Téléphone :

Date : .....

Emetteur : .....

Référence : .....

### ALU - CLOTURES

DEVIS     COMMANDE     SUITE DE CHANTIER - Référence : .....

Dimensions en mm

Exemplaire à photocopier

#### MODELE

Réf. Clôture .....

Alignement du projet

A ( Longueur entre maçonnerie formant 1 module )


B ( Hauteur clôture = dessus traverse )

C ( Hauteur muret )

D ( Hauteur pilier sous chapeau )

#### SCHEMA OBLIGATOIRE

( voir page suivante plan de masse de la clôture aluminium )



Légende :  Poteau droit 90x60

1/2 poteau

MODULE 1	Qté : .....
A : ..... B : ..... C : ..... D : .....	
Qté poteau : <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	
Qté cache platine : .....	
Qté 1/2 poteau : <input type="checkbox"/> .....	
Qté équerre de fixation murale : <input type="checkbox"/> .....	
( traverses )	

MODULE 2	Qté : .....
A : ..... B : ..... C : ..... D : .....	
Qté poteau : <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	
Qté cache platine : .....	
Qté 1/2 poteau : <input type="checkbox"/> .....	
Qté équerre de fixation murale : <input type="checkbox"/> .....	
( traverses )	

MODULE 3	Qté : .....
A : ..... B : ..... C : ..... D : .....	
Qté poteau : <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	
Qté cache platine : .....	
Qté 1/2 poteau : <input type="checkbox"/> .....	
Qté équerre de fixation murale : <input type="checkbox"/> .....	
( traverses )	

MODULE 4	Qté : .....
A : ..... B : ..... C : ..... D : .....	
Qté poteau : <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	
Qté cache platine : .....	
Qté 1/2 poteau : <input type="checkbox"/> .....	
Qté équerre de fixation murale : <input type="checkbox"/> .....	
( traverses )	

MODULE 5	Qté : .....
A : ..... B : ..... C : ..... D : .....	
Qté poteau : <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	
Qté cache platine : .....	
Qté 1/2 poteau : <input type="checkbox"/> .....	
Qté équerre de fixation murale : <input type="checkbox"/> .....	
( traverses )	


MODULE 6	Qté : .....
A : ..... B : ..... C : ..... D : .....	
Qté poteau : <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	
Qté cache platine : .....	
Qté 1/2 poteau : <input type="checkbox"/> .....	
Qté équerre de fixation murale : <input type="checkbox"/> .....	
( traverses )	

#### RAL ALU COULEUR

- Beige 1015 FSM     Gris 7035 FSM     Blanc 9016 FSM
- Rouge 3004 FSM     Gris 7039 FSM     Noir 2100 Sablé
- Vert 6005 FSM     Brun 8019 FSM     Gris 2900 Sablé
- Gris 7016 FSM
- Autre : .....
- Kit de retouche : 40€ HT

#### EMBOUT DECO ALUMINIUM LAQUE


- Boule     Pointe     Fleur de Lys     Fer de Lance



- Couleur Doré     Couleur du portail     Autre RAL

#### FIXATION DES POTEAUX

- Avec scellement
- Sans scellement
- Patte en U ( Ht. maxi 500 )
- Platine ( pour poteau droit )

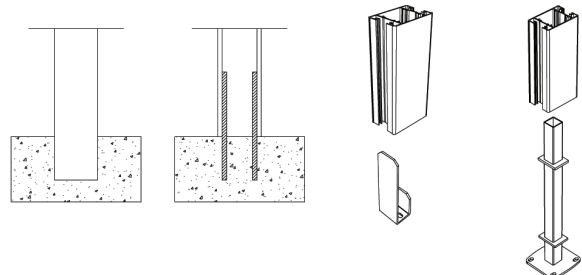

# Plan de masse Clôtures Aluminium 2/2 Gamme CASTEL

VUE DE DESSUS : Préciser où se situe l'extérieur de la propriété ( EXT )

VUE DE FACE : Placez-vous à l'extérieur

ATTENTION : Si alignement avec le portail, donner la hauteur des murets.

Emetteur :

.....

Référence chantier :

.....

**NOTICE DE POSE CLOTURE ( toujours vue extérieure ) : Attention : NOS CLOTURES NE DOIVENT EN AUCUN CAS FAIRE OFFICE DE GARDE CORPS.**


Afin de procéder à l'installation de la clôture : Verifier les côtes des clôtures livrées par rapport à votre commande et suivant la confirmation que nous vous avons envoyée - Verifier les dimensions entre les piliers, ainsi que les hauteurs - Répartir les éléments de clôture en fonction du plan joint en annexe - La pose doit s'effectuer dans l'axe du muret - Respecter les intervalles définis sur le plan, et l'axe de pose des poteaux

- Tracer sur le muret l'emplacement de ceux-ci - Selon votre choix, préfixer les poteaux soit : - par crapaudine - fer béton ( non fourni )
- à sceller ou sur platine selon les supports - Adapter les chevilles et vis à la structure ( non fournies ) - Enfiler les clôtures les une après les autres - Avec un niveau vérifier l'aplomb et le niveau quitta à encastrer légèrement un angle - Caler l'ensemble avant la fixation définitive
- Important : glisser une bande de polystyrène de 10mm d'épaisseur dans les poteaux, celle-ci servira de jeu de dilatation et évitera l'entrée de ciment ou eau à l'intérieur des traverses - Pas de remplissage au ciment prompt - Couler votre ciment à environ 1/3 de la hauteur du poteau ou au minimum noyer les crapaudines ou le fer à béton - Pour les poteaux sur platines : fixer les poteaux à l'aide de vis auto taraudeuses ou coller au silicone - Coller les embouts avec du silicone et nettoyer l'ensemble à l'eau tiède savonneuse - **Entretien** : laver à l'eau tiède savonneuse à l'aide d'une éponge puis rincer à l'eau propre 2 fois l'an ou plus suivant l'exposition.


DESSIN

VUE DE FACE


VUE DE DESSUS

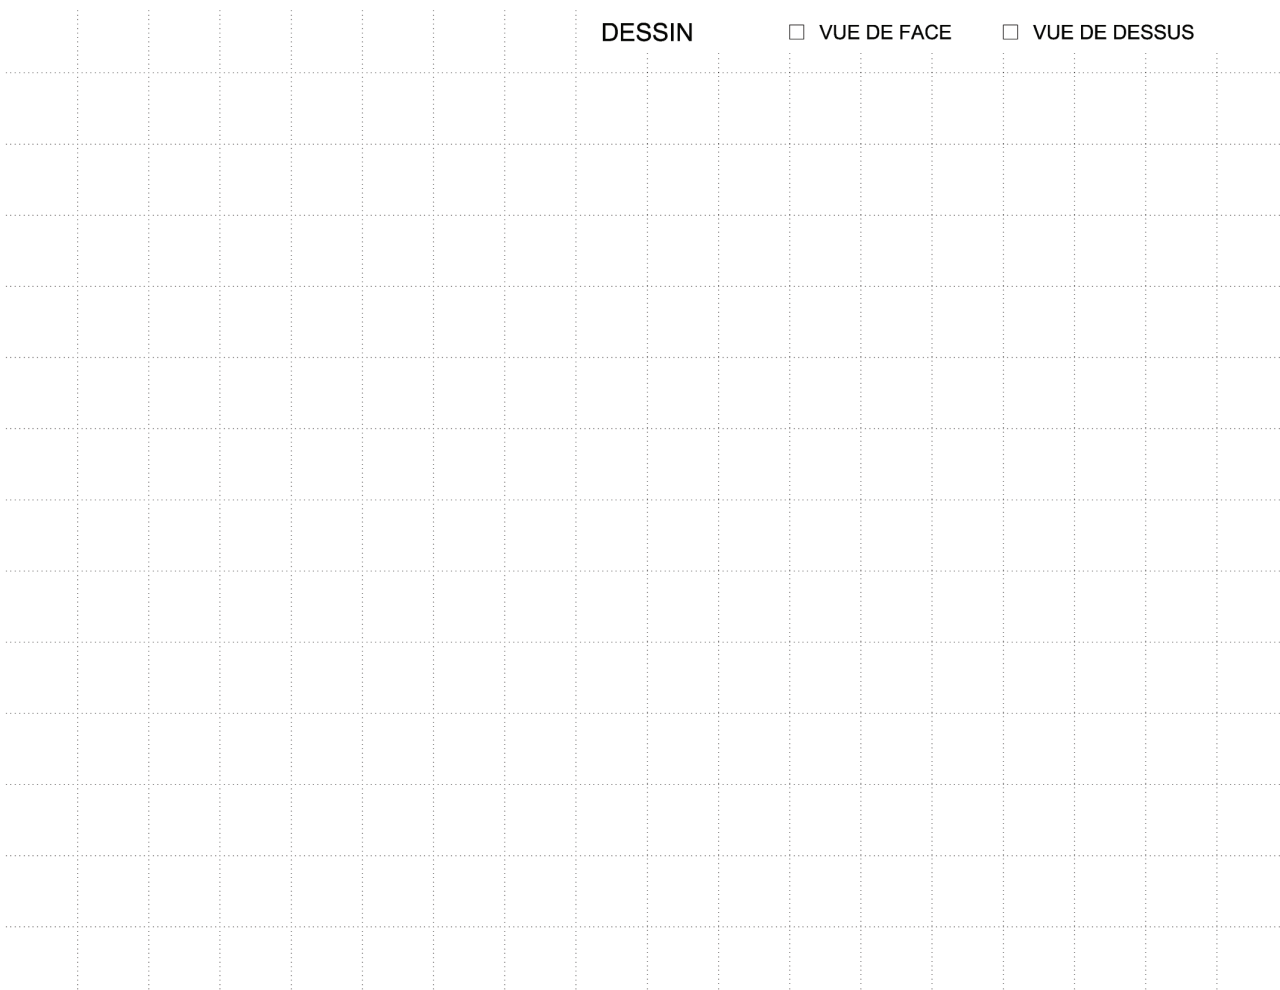

Avec scellement




Sans scellement



Patte en U ( Ht. maxi 500 )



Platine ( pour poteau droit )



	Poteau droit
Intermédiaire	
Finition	
Angle	
1/2 poteau	
Equerre de fixation murale	
